


某市城市污水处理工程劳动力用工计划表

工种	人数	目前在何地工作	计划进场时间	计划退场时间
管工	16	公司技术培训处	按施工进度要求	根据现场情况定
电工	22	公司技术培训处	按施工进度要求	根据现场情况定
焊工	8	公司技术培训处	按施工进度要求	根据现场情况定
起重工	6	公司技术培训处	按施工进度要求	根据现场情况定
泥工	10	公司技术培训处	按施工进度要求	根据现场情况定
铆工	3	公司技术培训处	按施工进度要求	根据现场情况定
油漆工	3	公司劳务市场	按施工进度要求	根据现场情况定
普工	16	公司劳务市场	按施工进度要求	根据现场情况定
管理人员	8	公司机关	项目开工	项目竣工
合计	96			

劳动力资源动态分布

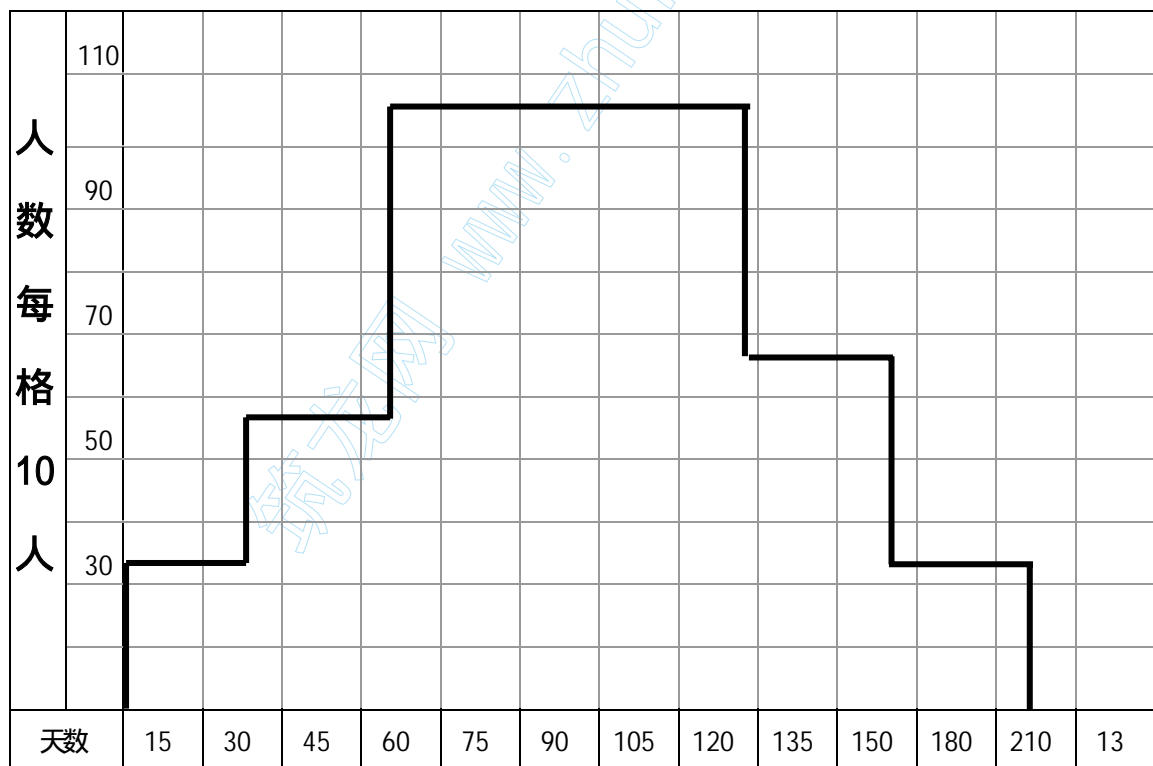

某市城市污水处理工程施工机械配备计划

机械名称	牌号	产地	使用年限	规格	数量	目前在何处	计划进场与退场时间
工具车	五十铃	江西	4	1.25T	1	公司设备处	开工至结束
吊车			5	25T	1	公司设备处	安装时进场
叉车			4	5T	1	公司设备处	安装时进场
电焊机	BX ₃ -300-1	浙江	1-3	26KVA	3	公司设备处	配合期 2 台,后期随进度
电焊机	卧式	杭州	2	15KVA	2	公司设备处	配合期 2 台,后期随进度
电动切割机	400	杭州	1.5	2KW	4	公司设备处	配合期 2 台,后期随进度
台钻	Z512B	杭州	2	0.75KW	3	公司设备处	开工至结束
液压弯管机	PDS-4	上海	2	0.75KW	2	公司设备处	电气安装时进场
电动套丝机	Z3T-R4	杭州	1	0.75KW	6	公司设备处	管道安装时进场
剪板机	Q11-682500	南京	3	2.2KW	1	公司设备处	风管制作时进场
管子切割器		宁波	1		2	公司设备处	管道安装时进场
电锤	TE-15	德国	2-3	0.5KW	4	各专业班组	安装时进场
角向磨光机	日立	日本	2	0.15KW	4	各专业班组	安装时进场
卷扬机	JM-3	杭州	4	3KW	1	公司设备处	开工至结束
砂轮切割机	M3030	杭州	1	2.2KW	4	公司设备处	开工至结束
电动试压泵	DSZY	杭州	1	0.75KW	2	公司设备处	管道试压时进场
空压机	V-0.67/7	杭州	3	4KW	1	公司设备处	管道试压时进场
焊条烘箱	101A-1	杭州	2	6KW	1	公司设备处	开工至结束
水准仪	D53	南京	4		2	公司设备处	开工至结束
手拉葫芦		杭州	3	5T	5	公司设备处	开工至结束
手枪钻	日立	日本	2-3	0.15KW	6	各专业班组	开工至结束
千斤顶		杭州	4	5T	6	公司设备处	开工至结束
火焊工具			0.5		4	各专业班组	开工至结束
电气测试仪表			3		1	公司设备处	开工至结束
管道测试仪表			2		1	公司设备处	开工至结束

注：最高用电容量：90 千瓦；

平均用电容量：65 千瓦

某花园 A 标施工机械配备计划

机械名称	牌号	产地	使用年限	规格	数量	目前在何处	计划进场与退场时间
工具车	五十铃	江西	4	1.25T	1	公司设备处	开工至结束
电焊机	BX ₃ -300-1	浙江	1-3	26KVA	3	公司设备处	配合期 2 台,后期随进度
电焊机	卧式	杭州	2	15KVA	2	公司设备处	配合期 2 台,后期随进度
电动切割机	400	杭州	1.5	2KW	4	公司设备处	配合期 2 台,后期随进度
电动套丝机	Z3T-R4	杭州	1	0.75KW	6	公司设备处	管道安装时进场
液压弯管机	PDS-4	上海	5	0.75KW	2	公司设备处	电气安装时进场
管子切割器		宁波	1		2	公司设备处	管道安装时进场
按口咬口机	YZA-10	陕西	3	0.75KW	2	公司设备处	风管制作时进场
液压折边机	WB67Y-100 /3200	江苏	2	3KW	1	公司设备处	风管制作时进场
剪板机	Q11-682500	南京	3	2.2KW	1	公司设备处	风管制作时进场
台钻	Z512B	杭州	2	0.75KW	3	公司设备处	开工至结束
电锤	TE-15	德国	2-3	0.5KW	4	各专业班组	安装时进场
角向磨光机	日立	日本	2	0.15KW	4	各专业班组	安装时进场
卷扬机	JM-3	杭州	4	3KW	1	公司设备处	开工至结束
砂轮切割机	M3030	杭州	1	2.2KW	4	公司设备处	开工至结束
电动试压泵	DSZY	杭州	1	0.75KW	2	公司设备处	管道试压时进场
空压机	V-0.67/7	杭州	3	4KW	1	公司设备处	管道试压时进场
焊条烘箱	101A-1	杭州	2	6KW	1	公司设备处	开工至结束
水准仪	D53	南京	4		2	公司设备处	开工至结束
手拉葫芦		杭州	3	5T	5	公司设备处	开工至结束
手枪钻	日立	日本	2-3	0.15KW	6	各专业班组	开工至结束
千斤顶		杭州	4	5T	6	公司设备处	开工至结束
火焊工具			0.5		4	各专业班组	开工至结束
电气测试仪表			3		1 套	公司设备处	开工至结束
通风测试仪表			1		1 套	公司设备处	开工至结束
管道测试仪表			2		1 套	公司设备处	开工至结束

注：最高用电容量：120 千瓦；

平均用电容量：90 千瓦
